

**Ofício TBP 033-2018**

**Gramado, 18 de setembro de 2018**

**Senhores(as) Clientes,**

*Ao tempo que os cumprimentamos, os parabenizamos por fazer parte do primeiro complexo multiuso da Serra Gaúcha, o **VITA Boulevard**.*

*É com grata satisfação que utilizamos este espaço para informa-los sobre o andamento da obra. É sabido que iniciamos a execução do complexo em meados de abril do ano passado, e desde então estamos incessantemente primando para produzir o melhor produto, conforme Memorial Descritivo de seu conhecimento, visando o cumprimento do prazo e a satisfação de nossos clientes.*

*Imperioso destacar também nosso compromisso de sustentabilidade com o meio ambiente, uma vez que na execução das escavações retiramos e doamos para a Cidade de Gramado mais de **50.000 m3** de rocha.*

*Apresentamos abaixo imagens do atual estágio da execução para acompanhamento.*






No dia **15/10** próximo, iremos iniciar a etapa de execução da superestrutura de todo o empreendimento. Para tanto, utilizaremos a tecnologia de construção com peças pré-fabricadas. O uso desta metodologia construtiva nos permitirá, entre outras vantagens, a garantia de que no prazo de 9 (nove) meses estaremos com toda a parte estrutural concluída, além de que todas as peças serem produzidas em ambiente industrial e de forma antecipada, conforme imagens abaixo :



O processo será executado em duas etapas :

- a primeira ( em vermelho ) com previsão de conclusão para o final da primeira quinzena de dezembro deste ano ;
- e a segunda ( em azul ) iniciando na segunda quinzena de janeiro do ano vindouro, concluindo totalmente a superestrutura de todo o complexo até o final do mes de Junho / 2019 ; e demais prazos conforme Contrato assinado ;

Etapas Construtivas

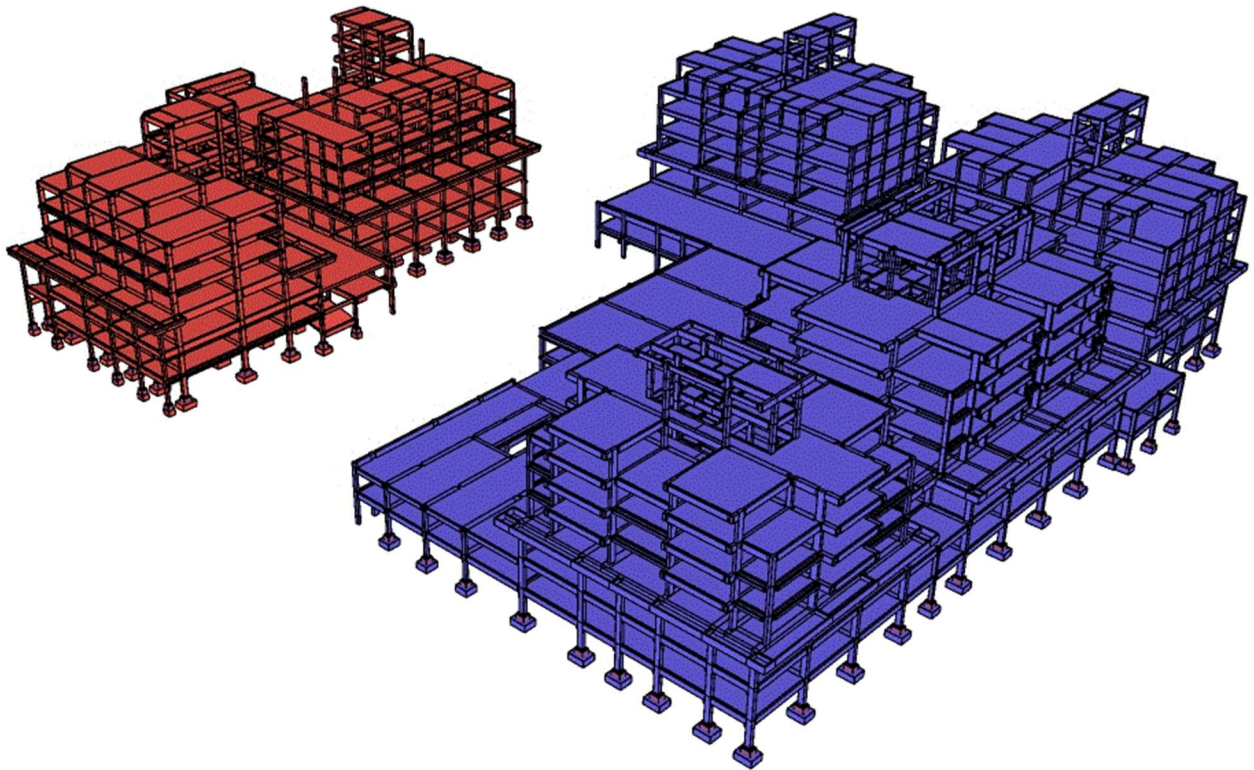

Aproveito para convidá-los a acompanhar nossa execução através de uma vitrine instalada no Espaço VITA Boulevard. Será um prazer recebê-los novamente!

Atenciosamente,

-----  
VITA Boulevard
